Untitled Gantt Project

16.10.2018

http://

Управляющий проектом ALyona

Сроки проекта 10.09.2018 - 28.12.2018

Выполнено34%Задачи35Исполнители5

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Определение тематики проекта	10.09.18	17.09.18
Работа с документацией проекта	10.09.18	24.12.18
Изучение необходимых технологий	18.09.18	24.12.18
Изучение архитектуры Android-приложений	18.09.18	25.09.18
Изучение сред разработки	18.09.18	23.10.18
Изучение Java	18.09.18	24.12.18
Установка необходимых компонентов	26.09.18	17.10.18
Составление плана проекта	18.09.18	24.09.18
Разработка 0-версии плана проекта	18.09.18	20.09.18
Определение зон ответственности разработчиков	21.09.18	24.09.18
Представление заказчику плана проекта	25.09.18	25.09.18
Составление спецификации требований	25.09.18	15.10.18
Первчиный список требований	25.09.18	08.10.18
Модель требований	25.09.18	08.10.18
Функциональная модель	01.10.18	15.10.18
Высокоуровневая архитектура	01.10.18	15.10.18
Критерии аттестации системы	08.10.18	15.10.18
Представление заказчику спецификации требований	16.10.18	16.10.18
Проектирование	16.10.18	05.11.18
Проект архитектуры	16.10.18	23.10.18
Проект интерфейса пользователя	16.10.18	23.10.18
Проект подсистем	22.10.18	29.10.18

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	
Структура кода	22.10.18	05.11.18	
Проект сборки и установки системы	29.10.18	05.11.18	
Представление заказчику документа проектирования	06.11.18	06.11.18	
Кодирование	06.11.18	10.12.18	
Подготовка к этапу тестирования	11.12.18	11.12.18	
Тестирование и отладка	11.12.18	24.12.18	
Разработка плана тестирования	11.12.18	17.12.18	
Описание методов и их обоснование	11.12.18	24.12.18	
Варианты тестов	18.12.18	24.12.18	
Подготовка к аттестации	25.12.18	27.12.18	
Написание руководства пользователя	25.12.18	27.12.18	
Метрики проекта	25.12.18	27.12.18	
Презентация и аттестация проекта	28.12.18	28.12.18	


Исполнители

<u>РМИ</u>	Стандартная роль						
ALyona	управляющий проектом						
Nastya	составитель документации						
Zhenya	разработчик						
Dmitry	разработчик						
Daniil	разработчик						

4

5

GanttChart

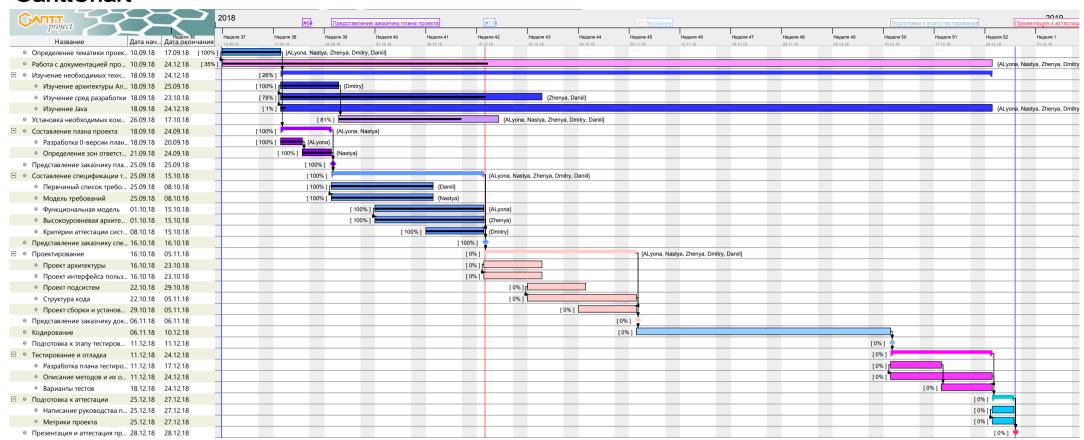

Untitled Gantt Project 16.10.2018

Занятость ресурсов

GANTT 2018			Представление заказчику плана проекта #114					#117					Подготовка к этапу тестирования			2010 Презентация и аттестаці		
Имя	неделя 36 Стандартная	Неделя 37 10.09.18	Неделя 38 17.09.18	Неделя 39 24.09.18	Неделя 40 01.10.18	Неделя 41 08.10.18	Неделя 42 15.10.18	Неделя 43 22.10.18	Неделя 44 29.10.18	Неделя 45 05.11.18	Неделя 46 12.11.18	Неделя 47 19.11.18	Неделя 48 26.11.18	Неделя 49 03.12.18	Неделя 50 10.12.18	Неделя 51 17.12.18	Неделя 52 24.12.18	Неделя 1 31.12.18
± • ALyona	управляющ	55%	435%	365%	465%	465%	365%335%	335%235%	235%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%		
■ Nastya	составитель	50%	480%	540%	540%	440%		330%	330%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%		
■ Zhenya	разработчик	35%	315%	440%	540%	540%		315%	315%	215%	215%	215%	215%	215%	215%	215%		
■ Dmitry	разработчик	35%	415%	440%	440%	540%		315%	315%	215%	215%	215%	215%	215%	215%	215%		
⊕ Daniil	разработчик	35%	315%	540%	540%	440%		315%	315%	215%	215%	215%	215%	215%	215%	215%		

6
